문서 번호 : 2

프로젝트 관리 계획서

[지도 위에 쓰다, OnMap]

소속	한국항공대학교 Korea Aerospace University
팀명	아니오(안이오)
팀원	안정규
	이철수
	오영희
지도교수	최차봉 교수님
GitHub	https://github.com/StabAn-NRH/KAU_SoftwareEngineering

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1	2026/04/13	안정규	프로젝트 관리 계획서 작성	

목 차

1. 서론 ---------- 1
1.1 문서의 목적 및 범위 ---------- 1
1.2 프로젝트 개요 ---------- 1
1.3 프로젝트 목표 ---------- 2
1.4 용어 정의 ---------- 2
1.5 참조 문서 ---------- 2

2. 개발 계획 ---------- 3
2.1 개발 절차 모형 ---------- 3
2.2 WBS(Work Breakdown Structure) ---------- 3
2.3 개발 내용 ---------- 4
2.4 개발 일정 ---------- 5

3. 팀 구성 ---------- 6
3.1 팀 구조 ---------- 6
3.2 역할 및 책임 ---------- 6

4. 품질 관리 ---------- 7
4.1 팀 미팅 계획 ---------- 7
4.2 변경 사항 관리 방법 ---------- 7
4.3 산출물 관리 방법 ---------- 8

5. 개발 환경 ---------- 9
5.1 하드웨어 환경 ---------- 9
5.2 소프트웨어 환경 ---------- 9
5.3 기타 개발 환경 ---------- 9

6. 산출물 ---------- 10
6.1 산출물 정의 ---------- 10
6.2 산출물 작성일 및 담당자 ---------- 10
6.3 기타 제약사항 ---------- 11

7. 기타 사항 ---------- 11
7.1 리스크 관리 ---------- 11
8. 참고문헌 및 부록 ---------- 11

1. 서 론

1.1 문서 목적 및 범위

본 프로젝트 계획서는 지도 위에 쓰다, OnMap에 대한 전반적인 내용을 정리하여 프로젝트를 진행하는 데 있어 각 세부 사항의 지표로 삼는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 다음과 같은 범위의 지표로 적용할 수 있다.

① 프로젝트 개요 (프로젝트 정의, 주요 기능 정리)
② 개발 계획 및 환경 (개발 절차 모형, 내용 및 일정, 소프트웨어/하드웨어 환경)
③ 팀 구성 (팀 구조/역할 및 책임)
④ 품질관리 (팀 미팅, 변경 사항 및 산출물 관리)
⑤ 산출물 (산출물 정의, 작성일 및 담당자)

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

메모나 사용자의 관심 정보를 지도 위에 표시하는 시스템을 개발하고 이를 웹페이지나 모바일 애플리케이션을 통해 사용할 수 있게 한다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	API를 통해 불러온 지도 위의 특정 지점에 메모를 작성
F02	장소를 선택하면 - 선택한 장소의 영업상태를 확인 - 선택한 장소의 전화번호로 전화 걸기 - 선택한 장소에 대한 코멘트를 작성
F03	- F01과 F02로 생성된 사용자 데이터를 목록으로 조회 - 조회한 사용자 데이터를 수정 및 삭제
F04	버스정류장을 선택하여 - 관심 버스정류장으로 등록 - 관심 버스정류장을 경유하는 관심 버스 등록 - 관심 버스의 실시간 도착 정보를 TAGO API를 통해 조회하여 지도에 표시
F05	지하철역을 선택하여 - 관심 지하철역으로 등록 - 관심 지하철역에 다음으로 도착하는 열차의 행선지와 실시간 도착 정보를 도시별 지하철 API를 통해 조회하여 지도에 표시
F06	특정 장소나 지점에 일정 잡기(사용자 일정 데이터의 생성)
F07	- 설정한 시간에 오늘의 일정들을 푸시 알림 - 일정에 설정해 둔 알림 받을 시기에 다다르면 일정 리마인더를 푸시 알림

1.3 프로젝트 목표

지도 위에 사용자가 정보를 추가할 수 있는 시스템을 구현하여 지도를 사용자화할 수 있게 한다. 관심 있는 장소의 정보를 한눈에 확인할 수 있게 하여 사용자 경험을 향상한다.

1.4 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
API	응용 프로그램에서 사용할 수 있도록 운영체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어할 수 있게 만든 인터페이스
장소 정보	위치 정보와 일반 정보로 구성된 장소에 관한 전반적인 정보
위치 정보	점, 선, 면 등으로 표현되는 공간 데이터

일반 정보	장소의 이름이나 주소, 전화번호 등 위치 정보에 결합되는 속성 데이터

1.4 참조 문서

[안이오]프로젝트정의서_260316_Doc-001.pdf

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

1) 소프트웨어를 개발하기 위한 개발 절차 모형

어느 정도의 요구사항 변경이 예상되므로 요구사항 변경에 유연하게 대응할 수 있도록 애자일 모형을 채택하였다. 애자일 모형 중에서 팀 중심의 스크럼 모형을 사용한다.

2) 개발 절차 모형과 함께 분석, 설계를 진행하기 위한 방법론

모듈화 설계를 통한 재사용성과 이식성의 향상을 위해 객체지향 방법론을 채택하였다.

2.2 WBS(Work Breakdown Structure)

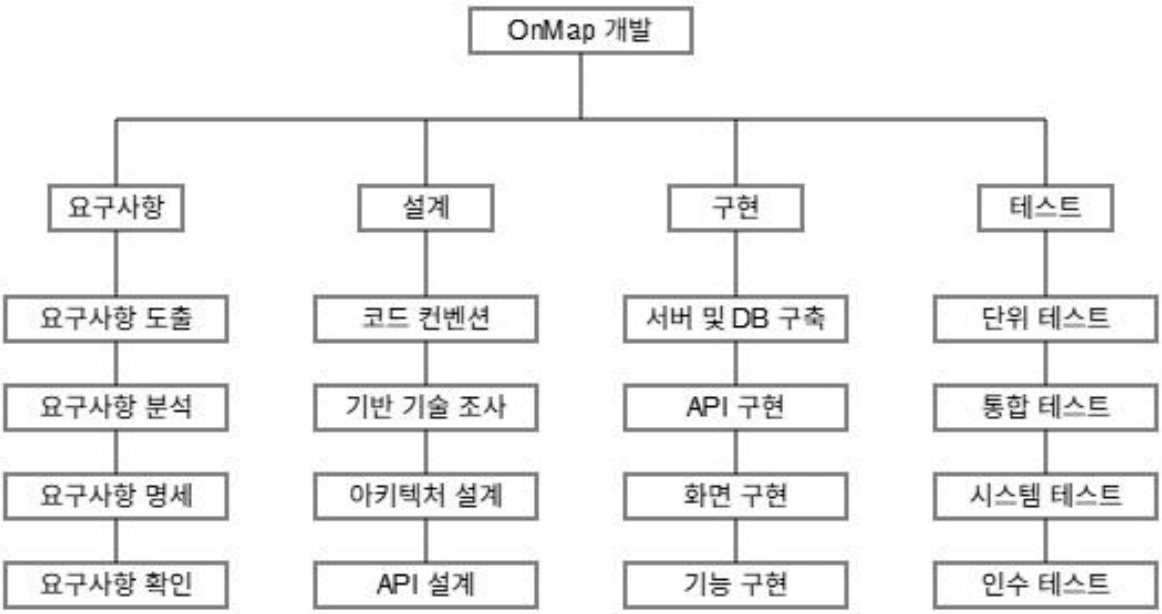

2.3 개발 활동

개발 활동	설명
프로젝트 정의	프로젝트 정의서 작성
프로젝트 관리 계획	프로젝트 관리 계획서 작성
요구사항 정의	요구사항 정의서 작성
요구사항 분석	요구사항 분석서 작성
제품 백로그	개발에 필요한 모든 요구사항을 우선순위에 따라 나열
스프린트 계획 회의	제품 백로그 중 이번 스프린트에서 수행할 작업을 대상으로 단기 일정을 수립하는 회의
일일 스크럼 회의	- 모든 팀원이 매일 약속된 시간에 약 15분 동안 진행 상황을 점검하는 회의 - 남은 작업 시간은 소멸 차트에 표시
스프린트	2~4주 동안 실제 개발 작업을 진행하는 과정
스프린트 회고	규칙 준수 여부 및 개선할 점을 확인하고 기록
스프린트 검토 회의	부분 또는 전체 완성 시 요구사항에 잘 부합하는지 테스팅하는 회의

2.4 개발 일정

활동	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
프로젝트 요약												
프로젝트 계획												
요구사항 정의 및 분석												
제품 백로그												
스프린트 계획 회의												
스프린트 1												
스프린트 2												
스프린트 3												
스프린트 4												
스프린트 5												
스프린트 6												
스프린트 7												
스프린트 8												
스프린트 9												
스프린트 10												
일일 스크럼 회의												

스프린트 회고												
스프린트 검토 회의												
프로젝트 종료												

3. 팀 구성

3.1 팀 구조

팀은 팀장과 팀원들로 구성된다. 팀의 일원들은 서로 수평적인 관계이며, 상호 협력하여 원만한 프로젝트의 진행을 위해 힘쓴다. 팀원들의 업무 과중을 예방하고 일관된 업무 흐름을 보장하기 위해 문서관리는 팀장이 담당한다. 다만, 팀원은 팀장과 협의하여 언제든 문서관리 작업에 관여할 수 있다.

3.2 역할 및 책임

이름	역할	책임 (공동 / 개별)	
안정규	팀장	자료조사	- 문서관리 - 기술 조사 - 시스템 환경 관리
이철수	팀원		- 서버 개발
오영희	팀원		- 웹 개발 - 애플리케이션 개발

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

(1) 스프린트 계획 회의
- 팀 미팅 시간 : 매주 수요일 9시 30분
- 토의 내용 : Sprint 목표와 Sprint Backlog를 계획
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장

(2) 일일 스크럼 회의
- 팀 미팅 시간 : 스프린트 계획 회의 날짜를 제외한 평일 9시 30분에 15분간 진행
- 토의 내용 : 어제 한 일, 오늘 할 일, 장애 현상 등을 공유
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장

(3) 스프린트 검토 회의
- 팀 미팅 시간 : Sprint 종료 시점
- 토의 내용 : Sprint 기간 동안 팀원 전체가 각자 한 일 리뷰
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장

(4) 스프린트 회고
- 팀 미팅 시간 : Sprint 종료 시점
- 토의 내용 : Sprint 기간 동안 팀 내부에서 발생한 일들을 회고하며 개선할 것, 잘한 것, 새로 시작할 것을 도출

(5) 비정기 회의
- 프로젝트 진행에 문제가 발생하여 회의가 필요한 경우에 진행된다.
- 비정기 회의는 팀장 또는 지도교수 또는 멘토에 의해 요청될 수 있다.
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장, (지도교수, 멘토)

4.2 변경사항 관리 방법

- 기능 변경을 위해 팀원 전체가 권한을 가져야 하며 다수결의 합의가 필요하다.
- 변경사항이 발생되는 경우 전-후 에 대해 반드시 기록물으로 남긴다.
- 관련 산출물은 팀원이 전부 소지한다.
- 기능 변경을 위해서는 팀원 전체의 합의가 필요하지만, 의견 충돌로 진행이 멈출 시에는 팀장이 좀 더 강력한 발언권을 갖는다.
- 변경 사항이 결정 되면 지도 교수님께 반드시 보고하고 경우에 따라 또 다시 변경 될 수 있다.

4.3 산출물 관리 방법

(1) 산출물에 대한 명명(Naming) 방법
- 소프트웨어 : 버전_해당 버전의 산출 일자
  (ex. v1_2026_04_16.exe)
- 문서 : [팀명]문서명_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
  (ex. [안이오]프로젝트관리계획서_191025_Doc-001.hwp)

(2) 산출물의 버전 관리 방법 및 버전관리 담당자
- 소프트웨어 : 파일명 맨 앞에 버전을 기재한다. (담당자: 팀원 전체)
- 문서 : 파일명 맨 뒤에 날짜를 기재하고, 문서 내에 제/개정 이력을 수정한다. (담당자 : 김두회)
- 그 외 파일 : 파일명 앞에 날짜가 붙으며 필요할 경우 1,2 등의 숫자를 추가하여 기재한다.
  (담당자 : 전체)

(3) 산출물의 저장 방법
- 소프트웨어 : Github
- 문서 : 하드웨어 및 팀원 공유 클라우드서버
- 그 외 파일 : 하드웨어 및 팀원 공유 클라우드

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 개발 환경

구분	spec
노트북	- 팀원 각자 자율적으로 하드웨어를 선택 - 권장사양 측정치 없음 - 추후 기입 요망

5.2 소프트웨어 개발 환경

구분	type	spec
Window	OS	Window 11

5.3 기타 개발 환경

해당없음

6. 산출물

6.1 산출물 정의

형식 : [팀명]문서명_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

ex)
- [안이오]프로젝트정의서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [안이오]프로젝트관리계획서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [안이오]요구사항정의서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [안이오]요구사항분석서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [안이오]소프트웨어설계서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

6.2 산출물 작성일 및 담당자

산출물	최종 작성일	최종 검토자	작성 책임자
[김검정]프로젝트정의서	2026-03-16	안정규	안정규
[김검정]프로젝트관리계획서	2026-04-13	안정규	안정규
[김검정]요구사항정의서	-		
[김검정]요구사항분석서	-		
[김검정]소프트웨어설계서	-		

6.3 기타 제약사항

해당사항 없음

7. 기타 사항

7.1 리스크 관리

No	Risk	Critical	Occur	Mitigation Plan	Alternative	Respon
1	팀원 변경	High	Low	업무량 분담 조정 팀원 간 화합	신규 인원 채용	안정규
2	주제 변경	High	Low	요구사항의 재설계 클라이언트 집중 면담	요구사항을 전면 재설계하고 클라이언트와 집중 면담을 진행한다.	안정규

8. 참고문헌 및 부록

-부록 1 : 프로젝트정의서 ([안이오]프로젝트정의서_260316_Doc-001)
